



**we make  
it work**

## Construction Summit 2024


ACC Build in Aktion: Implementierung und Leistungsoptimierung  
in der Bauleitung

# Scherr+Klimke AG | Kurzportrait.

SCM-INGENIEURE    TECHNIKER    KONSTRUKTEURE  
BRANDSCHUTZ    PROJEKTSTEUERER  
LOGISTIKER    ZEICHNER    BAUINGENIEURE  
LABORPLANUNG    STATIKER    BAUPHYSIKER

## GENERALPLANUNG

BAULEITER    PROJEKTASSISTENTEN  
BIM-MANAGER    HLS-/E-INGENIEURE    ARCHITEKTEN  
PROJEKT MANAGER    SiGeKo  
FACHPLANNER    GUTACHTER    VERWALTUNGS-ANGESTELLTE



150  
Mitarbeitende



>15 Jahre BIM  
Erfahrung

Auszeichnung: Autodesk  
BIM Excellence Award  
Building Smart Zertifikat




Scherr+Klimke  
STIFTUNG



Akten-  
Gesellschaft

2004  
↑  
1957



Ulm  
Neu-Ulm  
Leipzig



Top 2023  
Company



Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand

2024



Internationale  
Projekte




QM Zertifikat  
DIN EN ISO 9001

# Gründe für die ACC.

Projektplattform

## **AUTODESK** Construction Cloud

Modellierung

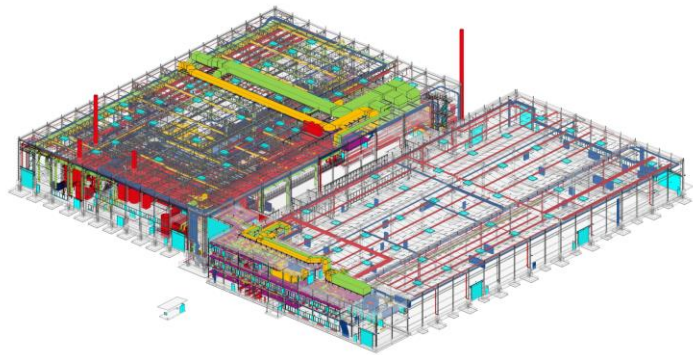

Projektleitung



Bauleitung



# Implementierung | Grundlegende Konfiguration.

Einfache Umsetzung

Begleitung durch Autodesk

Account-Lizenzen

Account-Struktur

The screenshot shows the 'Kontomitglieder' (Account Members) page in the Autodesk Construction Cloud Account Admin interface. The page includes a sidebar with navigation options like 'Projekte', 'Mitglieder', 'Firmen', 'Rollen', 'Projektvorlagen', 'Bibliothek', 'Apps', 'Benutzerdefinierte Int...', 'Einstellungen', and 'BIM 360-Administrator'. The main content area displays a table of members with columns for Name, Status, Firma, Vorgaberolle, Zugriffsebene, and Hinzugefügt am. A search bar and an 'Exportieren' button are also visible.


Name	Status	Firma	Vorgaberolle	Zugriffsebene	Hinzugefügt am
Alexander Osterm...	Aktiv	Scherr+Klimke	OPL	Projektmitglied	27.01.2023
Alexander Pöls	Aktiv	Scherr+Klimke	OPL	Projektmitglied	09.05.2023
Alexander Zerr	Aktiv	Scherr+Klimke	TPL	Projektmitglied	17.05.2023
Alicia Walser	Aktiv	Scherr+Klimke	TPL	Projektmitglied	17.04.2023
Ali Kumas	Aktiv	Scherr+Klimke	Objektüberwachung	Projektmitglied	19.01.2024
Andrea Junggebu...	Aktiv	Scherr+Klimke	TPL	Projektmitglied	17.05.2023
Andrea Loff	Aktiv	Scherr+Klimke	OPL	Projektmitglied	10.01.2023
Andreas Hepp	Aktiv	INS	Konstrukteur	Projektmitglied	15.02.2023
Andreas Kämpf	Aktiv	Scherr+Klimke	ELT	Projektadmin, Projektm...	08.05.2023
Andreas Malucha	Aktiv	Scherr+Klimke	OPL	Kein Zugriff	17.05.2023
Andreas Weber	Aktiv	Boehringer Ingelheim	-	Projektmitglied	26.10.2022

1-50 von 188 werden angezeigt

# Implementierung | Softwareverteilung Intune.

**AUTODESK** Construction Cloud

Verwalten von Baustelle und Büro  
- zentral mit einer App




**Registrieren**  
(Kostenlose 30-Tage-Testversion)

**Anmelden**

Aktuelles Rechenzentrum: Europa

[Rechenzentrum wechseln](#)

## Verfügbarkeit von Autodesk Desktop Connector und ACC-App

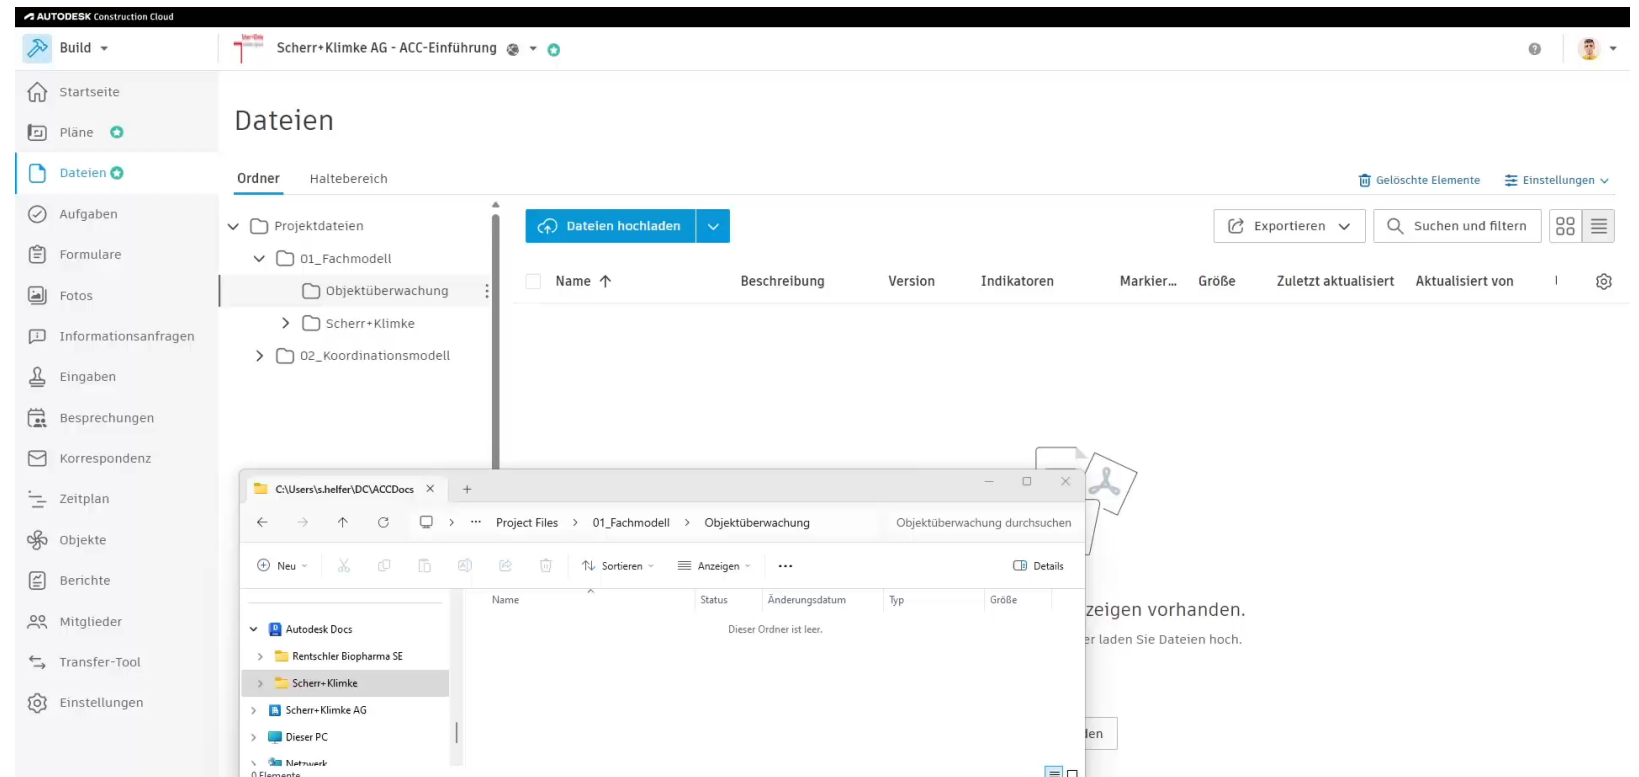

# Implementierung | Formulare und deren Verwaltung.

Zentrale Verwaltung und Verteilung

Rechteverwaltung

Formulareditor

smart PDF

Account Admin | Scherr+Klimke

Bibliothek /  
Formulare

Archiviert

+ Formularvorlage erstellen | Hinzufügen zu | Entfernen aus

Formularvorlagen nach Namen suchen...

<input type="checkbox"/>	Name	Typ	Hinzugefügt zu	Zuletzt aktualisiert
<input type="checkbox"/>	Bautagebuch	Tagesbericht	71	22. Jan. 2024
<input type="checkbox"/>	Modellkontrolle	Andere	7	17. Jan. 2024
<input type="checkbox"/>	Startgespräch	Andere	14	21. Nov. 2023
<input type="checkbox"/>	Bewehrungsabnahme	Qualität	71	6. Juni 2023

1-4 von 4 werden angezeigt

<< < 1 von 1 > >>



# Anwendungsbeispiele | Bautagebuch.

Digitales Bautagebuch

Formular-Export

Medienspeicherung

Intelligente Filter

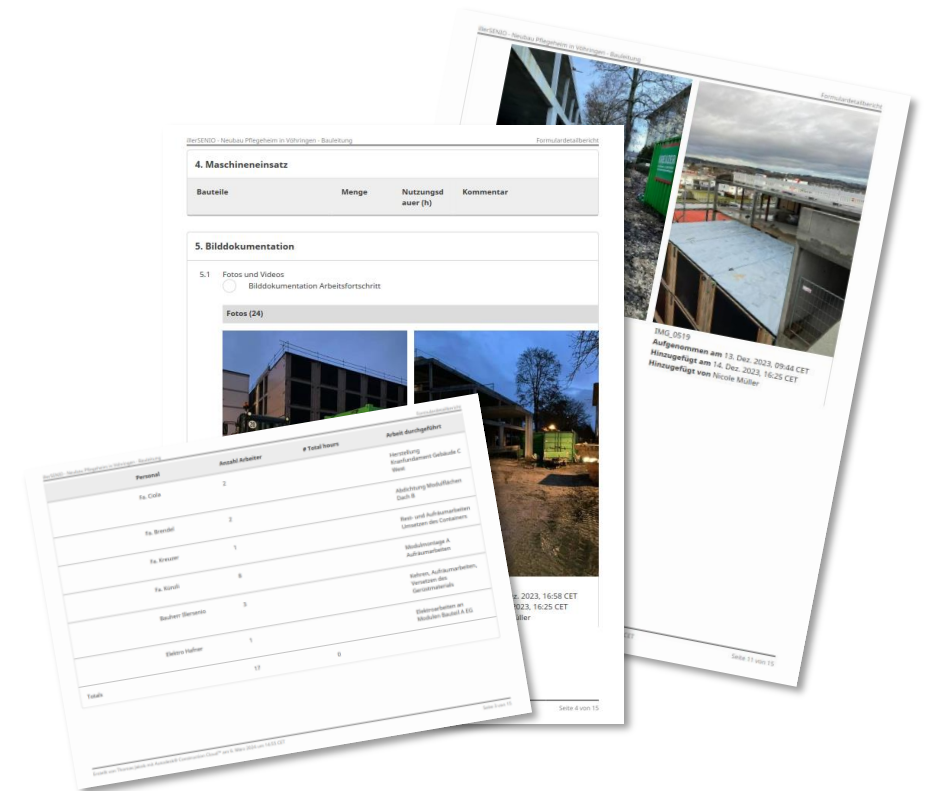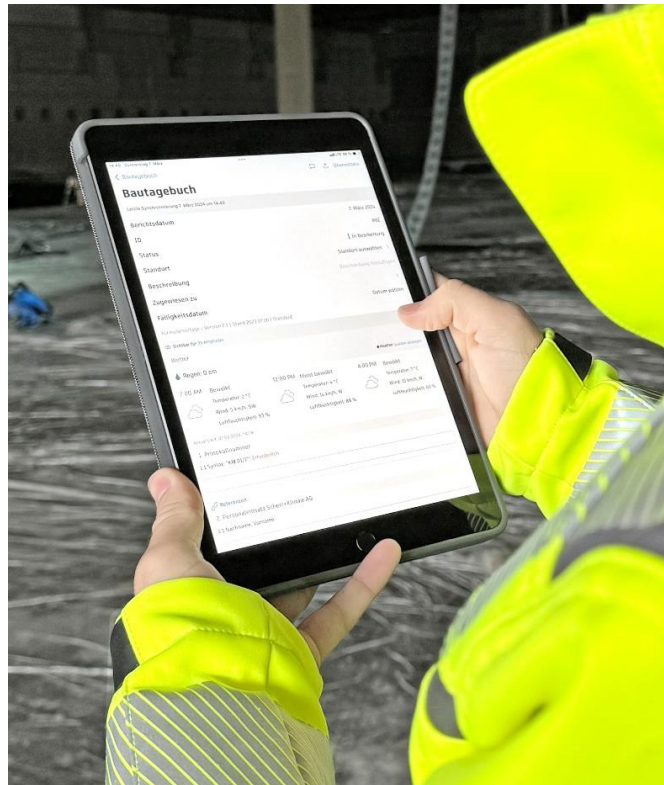


# Anwendungsbeispiele | Pläne.

Aktueller Index

Direkt-Publikation aus Revit

Index-Vergleich/Aufgaben-Verknüpfung

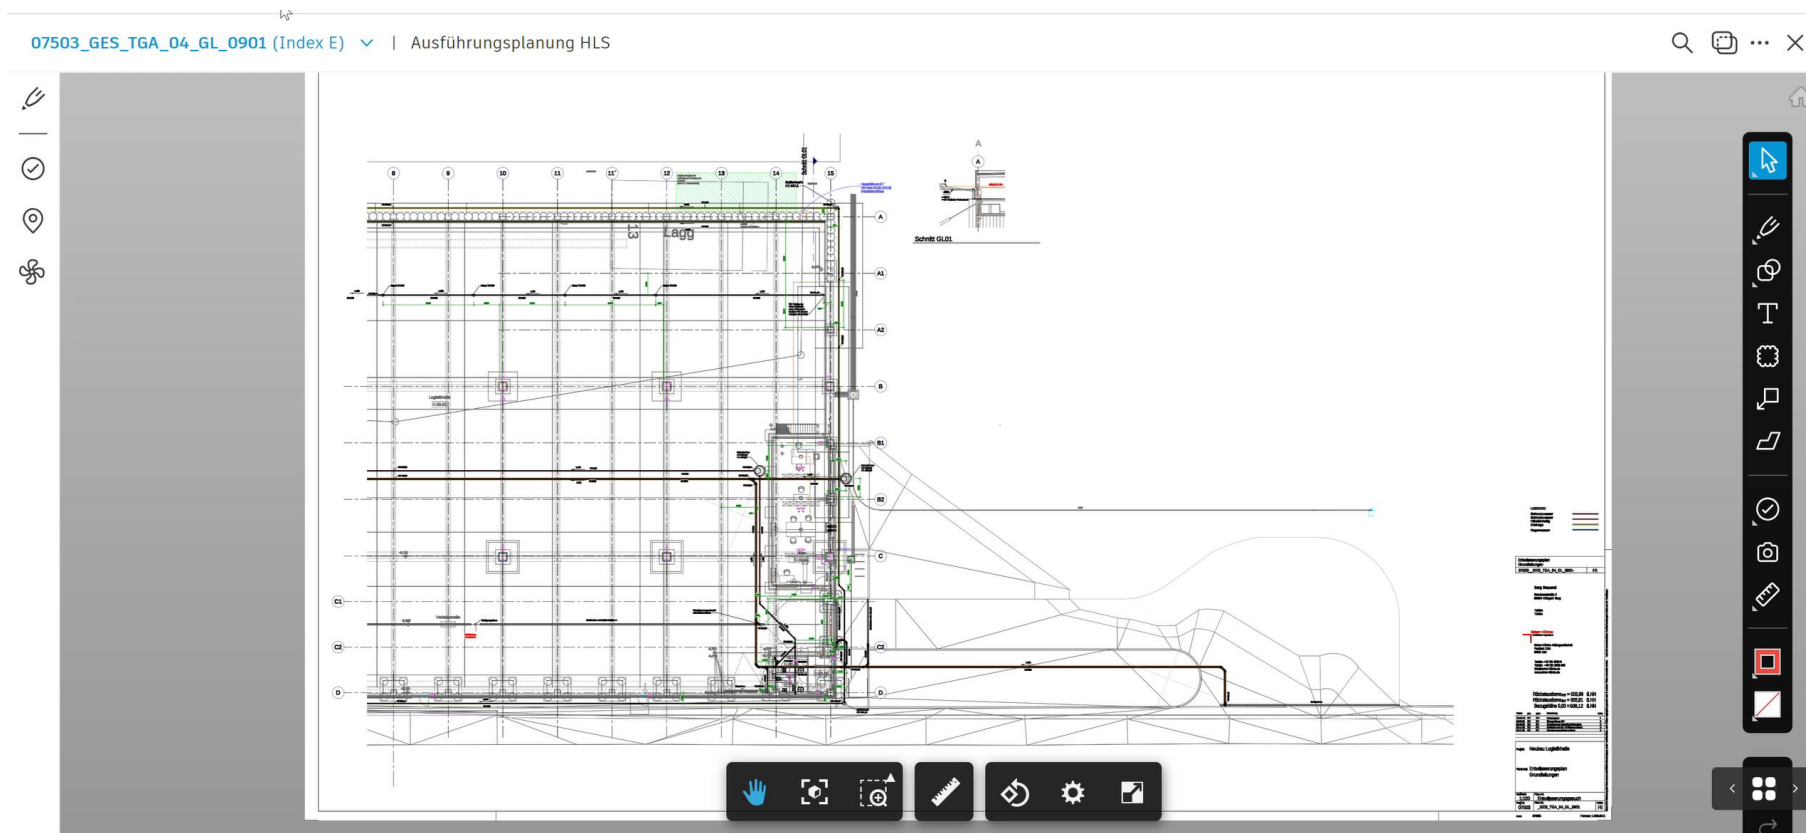




# Anwendungsbeispiele | Aufgaben und Mängelmanagement.

Aufgaben und Mängeln

Verantwortlichkeiten

Filterfunktionen

Rollen

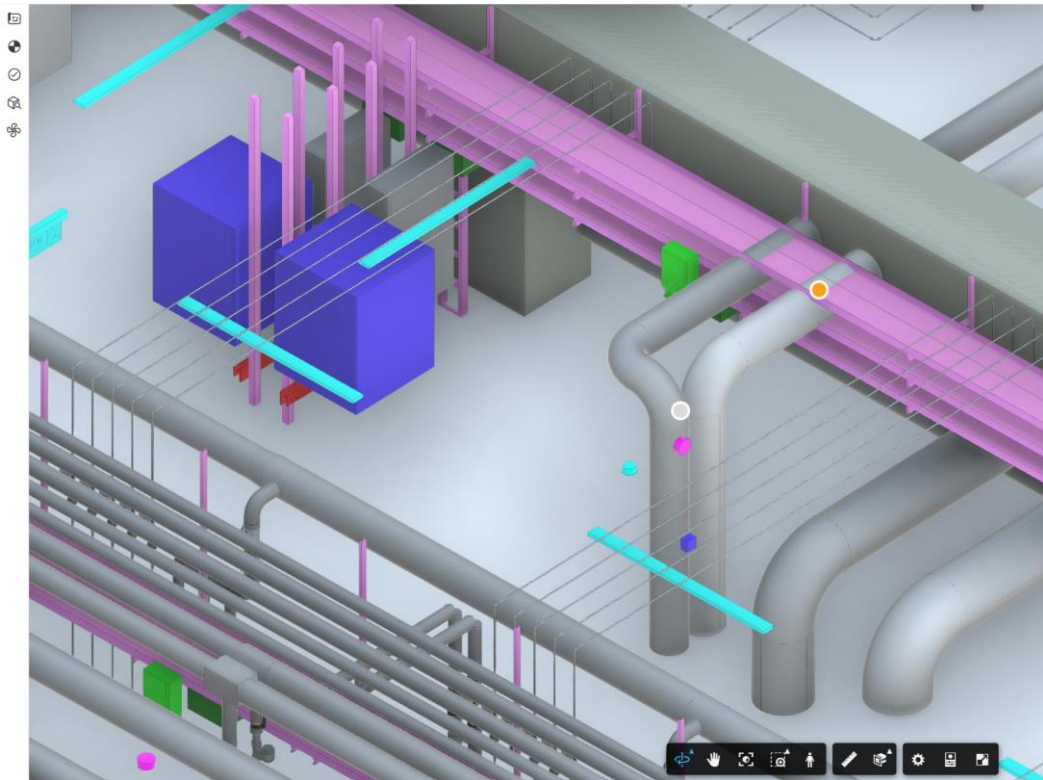

Titel	ID	Status	Typ	Zugeordnet zu	Fällig am	Startdatum	Platzierung
Problemliste							
☐ Allgemein	#147	Abgearbeitet	Allgemein	Jennifer Kneer	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#146	Abgearbeitet	Allgemein	Jennifer Kneer	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#145	Abgearbeitet	Allgemein	Jennifer Kneer	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#144	Abgearbeitet	Allgemein	Jennifer Kneer	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#143	Abgearbeitet	Allgemein	Jennifer Kneer	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#142	Offen	Allgemein	Herbert Wilde	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#141	Abgearbeitet	Allgemein	Nika Razmadze	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#140	Abgearbeitet	Allgemein	Nika Razmadze	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#139	Abgearbeitet	Allgemein	Nika Razmadze	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#135	In Bearbeitung	Allgemein	Jennifer Kneer	-	-	07580-ELT.rvt
☐ Clash	#94	Offen	Clash	Sarah Ziegler	28. Jan 2024	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#88	Offen	Allgemein	Florian Walter	28. Jan 2024	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#86	Offen	Allgemein	Florian Walter	28. Jan 2024	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#82	Ausstehend	Allgemein	Sarah Ziegler	-	-	07580-TGA.rvt
☐ Allgemein	#81	Offen	Clash	Sarah Ziegler	-	-	07580-TGA.rvt
☐ Allgemein	#80	Offen	Allgemein	Ragnar Jacob	28. Jan 2024	-	07580-ELT.rvt
☐ Allgemein	#4	Offen	Allgemein	-	-	-	Strangschema Kälte OC...



# Anwendungsbeispiele | Zeitplan.


Terminplan-Import

Kollaborative Arbeit

Aktuelle Koordination und Bearbeitung

The screenshot displays the Autodesk Construction Cloud interface for a project named 'Bergbrauerei Ethingen - Neubau Logistikhalle'. The main view is a Gantt chart for the period 2022-2024, with a detailed activity list on the left. A notification banner at the top indicates 'Sie haben 1 Vorschlag, die auf die Überprüfung warten'. The activity list includes tasks such as 'Halle nicht betretbar', 'Bodenplatten innen + außen', 'Herstellen Wendefläche Beton außen Ostseite', and 'Aufbau Fassadengerüst Achse A'. The Gantt chart shows task dependencies and progress bars across the timeline.

ID	Aktivitätsname	Start	Fertig stellen	% abgeschlossen	Auswirkung
354	-- Halle nicht betretbar -- Verlegen Dachtrapez.	15. Jan. 2024	24. Jan. 2024	0%	
355	Bodenplatten innen + außen	11. Jan. 2022	11. Jan. 2022	0%	
356	Herstellen Wendefläche Beton außen Ostseite	4. Dez. 2023	15. Dez. 2023	0%	
357	Herstellen Logistikhalle Beton Westseite	18. Dez. 2023	12. Jan. 2024	0%	
358	Herstellen Bodenplatte Innen	8. Feb. 2024	21. Feb. 2024	0%	
359	Fußbodenheizung Schneeschmelze	13. Feb. 2024	13. Feb. 2024	0%	
360	Bodenplatte Trocknung	22. Feb. 2024	6. März 2024	0%	
361	Versegelung Bodenplatte	29. Apr. 2024	10. März 2024	0%	
362	Baustelle räumen	22. Feb. 2024	28. Feb. 2024	0%	
363	◆ Fertigstellung Rohbaubeton	28. Feb. 2024	28. Feb. 2024	0%	
364	▼ Gerüstarbeiten	11. Dez. 2023 A	3. Apr. 2024	12%	
365	Aufbau Fassadengerüst Achse A	11. Dez. 2023	15. Dez. 2023	0%	
366	Aufbau Fassadengerüst Achse D	11. Dez. 2023 A	15. Dez. 2023 A	100%	
367	Aufbau Fassadengerüst Achse 15	11. Dez. 2023 A	15. Dez. 2023	15%	
368	Aufbau Fassadengerüst Achse 1	20. Dez. 2023	9. Jan. 2024	0%	
369	◆ Fassadengerüst montiert	9. Jan. 2024	9. Jan. 2024	0%	
370	Aufbau Gerüst Achse C	25. Jan. 2024	31. Jan. 2024	0%	
371	Abbau Gerüst Achse A	21. März 2024	27. März 2024	0%	
372	Abbau Gerüst Achse 1	28. März 2024	3. Apr. 2024	0%	
373	Abbau Gerüst Achse 15	28. März 2024	3. Apr. 2024	0%	
374	Abbau Gerüst Achse D	21. März 2024	27. März 2024	0%	

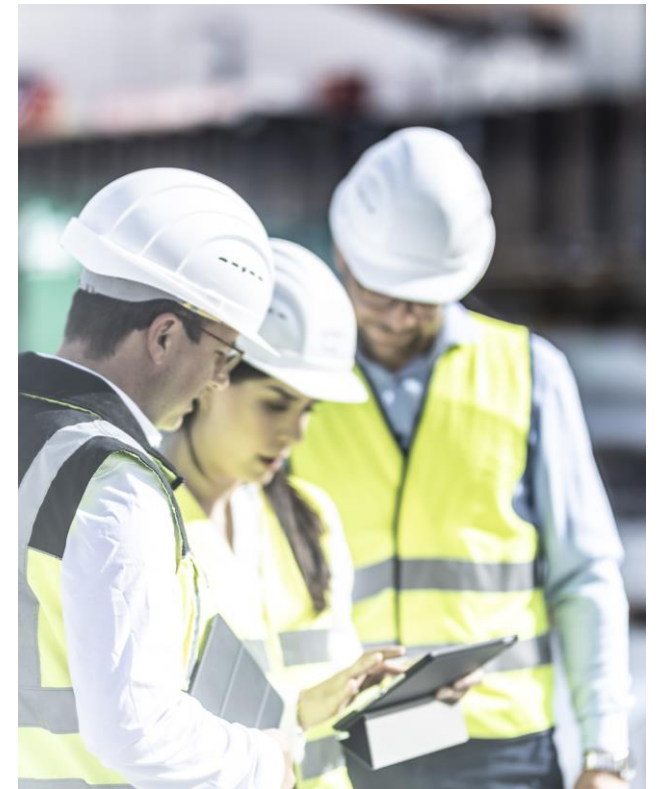


# Anwendungsbeispiele | 360°-Fotos.


Fortschritt-Demonstration

Bild-Dokumentation

360°-Kamera-Daten ohne Zusatz-Software

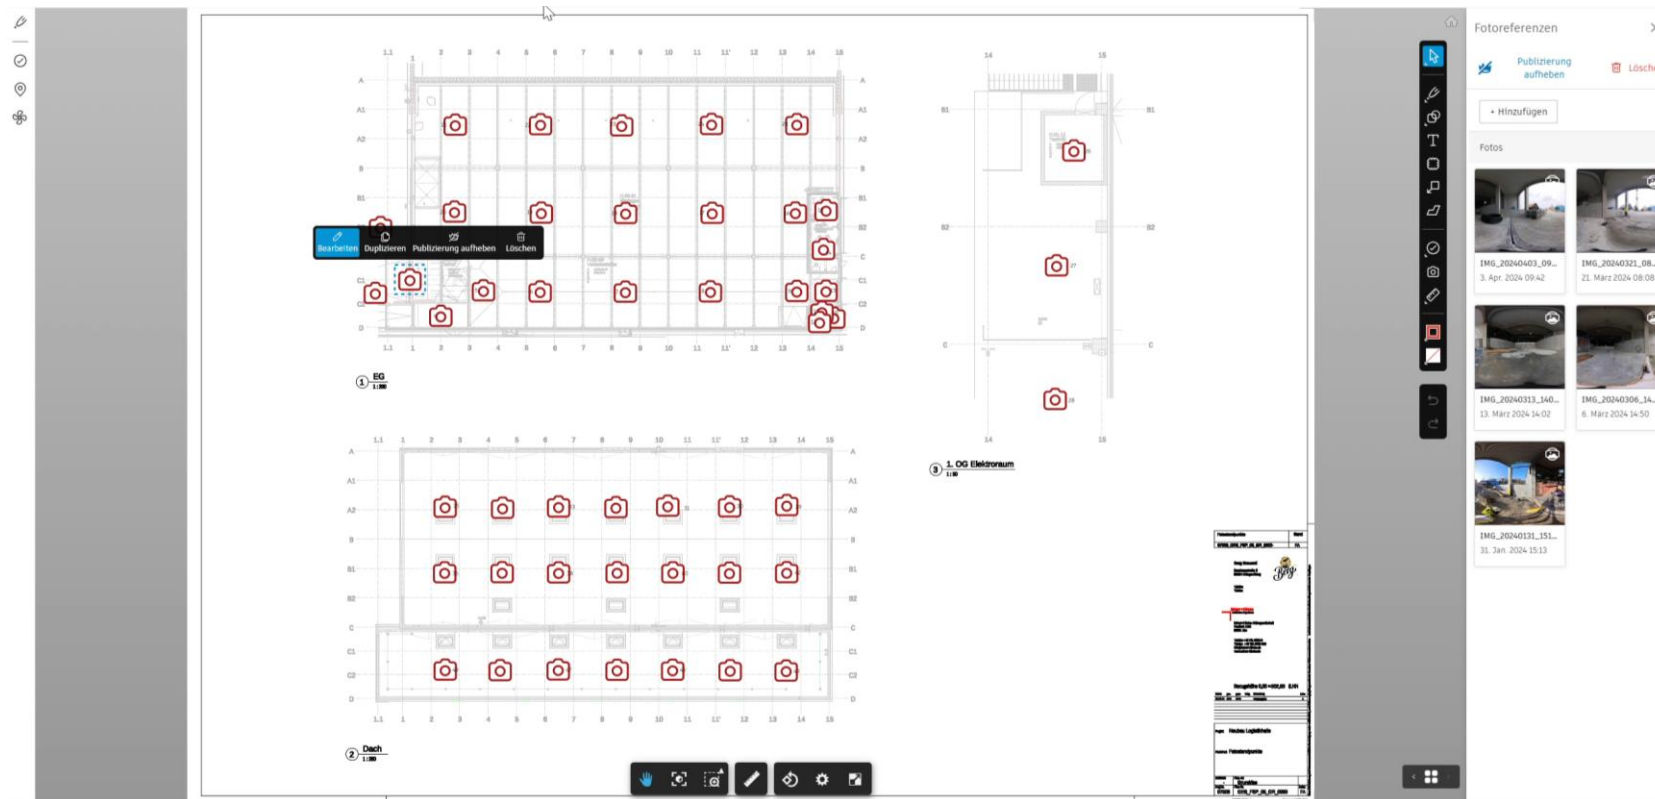

**Fazit und Ausblick.**

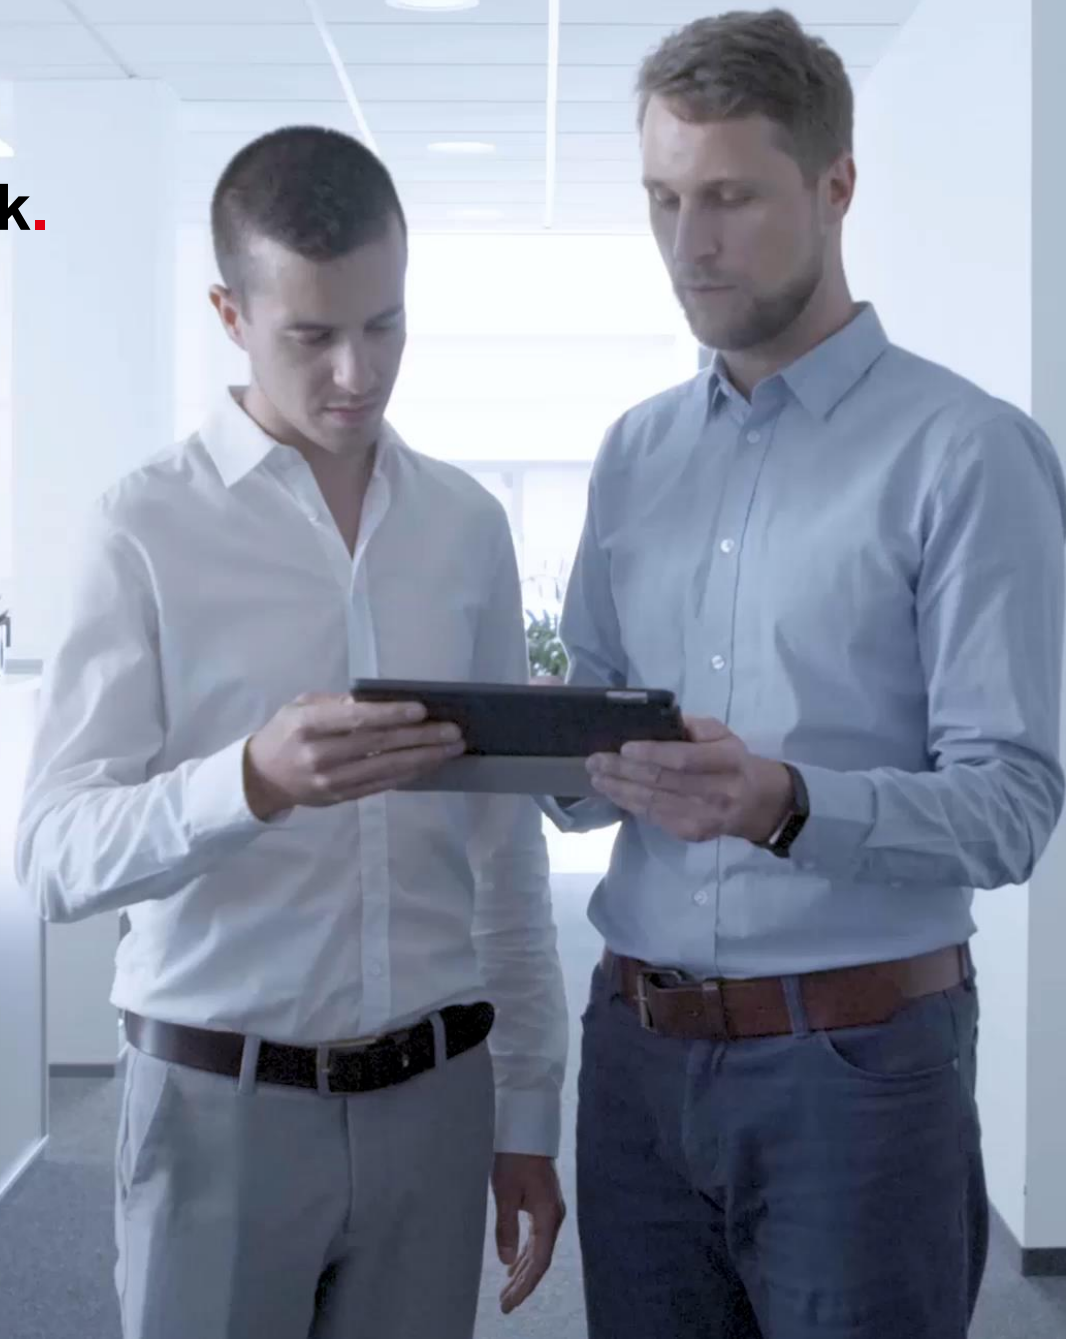

# Q&A.

**we make  
it work**

